



BULLETIN DE CHANTIER N°3

Votre Résidence située 6 à 16 avenue Jean Truffein à PERRIGNY LES DIJON





Madame, Monsieur,

A titre commercial, nous avons le plaisir de vous faire parvenir le 3^{ème} bulletin d'information grâce auquel vous pourrez constater l'avancement des travaux de la résidence « Le Hameau du Cèdre ».

Vous y découvrirez différentes photos et explications vous permettant de mieux visualiser et comprendre les travaux.

D'autres bulletins vous seront communiqués aux différentes étapes nous semblant importantes.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.


Avancement des travaux du 14 avril au 13 août 2021

Bâtiment E - LOT 407

- Cloisons, bandes, faux plafonds, rampants terminés,
- Les enduits de façade sont terminés,
- Les enduits de garnissage et lissage sont terminés,
- Dosserets de chaudière posés,
- Pose du carrelage et de la faïence en cours,
- Pose du papier peint en cours.



Bandes réalisées sur rampants en combles

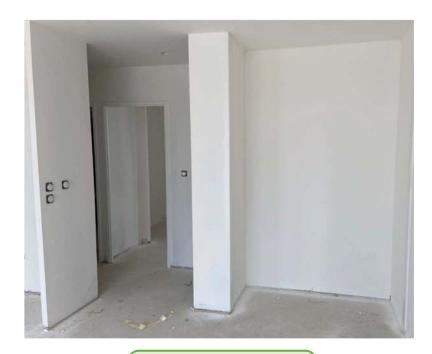

Enduit GS terminé en plafond et sur mur





Pose des dosserets de chaudière

Pose des baignoires



Réalisation du ragréage dans les chambres aux étages



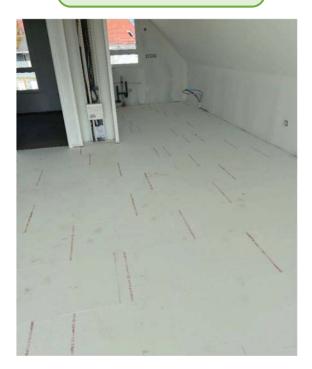







Préparation des terrasses (en béton)



Pose des dalles sur plots sur les terrasses des R+1



Terrasses réalisées en béton désactivé



Pose des clôtures entre jardins et en limite de propriété





Vue d'ensemble du bâtiment E





Bâtiment F – LOT 407

- Charpente et couverture terminées,
- Etanchéité des terrasses des logements et terrasses inaccessibles terminées,
- Menuiseries extérieures terminées, <u>LE BATIMENT F EST HORS D'EAU HORS D'AIR</u>
- Enduit de façade terminé,
- Doublage des logements terminé,
- Ravoirage et chape du RDC coulés,
- Pose des cloisons, faux plafonds et rampants terminés.



Chape et ravoirage coulés au RDC





Traçage et pose des cloisons et des rampants







Vue d'ensemble du bâtiment F depuis le bâtiment D















Bâtiment D - LOT 408

- Dallage RDC, R+1 et R+2 réalisés,
- Voiles posées,
- Pignons réalisés,
- Etanchéité des terrasses inaccessibles terminées, en cours au niveau des terrasses de logements,
- Charpente terminée,
- Couverture terminée,
- Menuiserie extérieure terminée => LE BATIMENT D EST HORS D'EAU HORS D'AIR.





Etanchéité des terrasses réalisée – Pose de la charpente



Vue depuis la place du Cèdre des bâtiments C & D







Bâtiment C - LOT 408

- Dallage RDC, R+1 et R+2 réalisés,
- Voiles posées,
- Pignons réalisés,
- Etanchéité des terrasses inaccessibles terminées, en cours au niveau des terrasses de logements,
- Couverture et charpente terminées,
- Menuiserie extérieure en cours de pose.





La dalle est coulée, l'élévation des murs est en cours





Pose de la Couverture et charpente & menuiserie extérieure

Bâtiment A – LOT 409

- Dallage RDC, R+1 et R+2 réalisés,
- Voiles posées,
- Pignons réalisés.



Préparation de la dalle haute du RDC





Bâtiment B – LOT 409

- Dallage RDC, R+1 et R+2 réalisés,
- Voiles posées,
- Pignons réalisés.



Coulage du gros béton

Maçonnerie terminée



3. Point Sécurité



Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, nous vous rappelons que <u>le chantier est</u> <u>strictement interdit au public.</u>

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'informations au 03.80.28.81.70

Votre équipe BFC P ROMOTION HABITAT
